

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

=====***=====



HaUI

**SCHOOL OF INFORMATION
& COMMUNICATIONS TECHNOLOGY**

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN THUỘC HỌC PHẦN
QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG WEBSITE BÁN ASSET
PIXEL

GVHD : ThS. Nguyễn Đức Lưu
Nhóm : 10
Lớp : 20251IT6033002

Hà Nội - 2025

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

=====***=====



HaUI

**SCHOOL OF INFORMATION
& COMMUNICATIONS TECHNOLOGY**

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN THUỘC HỌC PHẦN
QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG WEBSITE BÁN
ASSET PIXEL

GVHD	: ThS. Nguyễn Đức Lưu
Nhóm	: 10
Lớp	: 20251IT6033002
Sinh viên thực hiện	: Nguyễn Hữu Tú - 2022604052 Ngô Hữu Tùng - 2022604648 Nguyễn Anh Tuấn - 2022603876 Lê Hải Quang - 2022603970 Nguyễn Văn Đại - 2022603694

Hà Nội - 2025

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, chúng em xin gửi lời tri ân chân thành tới thầy Nguyễn Đức Lưu. Thầy không chỉ là người hướng dẫn mà còn là nguồn động viên và sự hỗ trợ quan trọng trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu của chúng em. Sự quan tâm tận tâm và lòng nhiệt huyết của thầy đã giúp chúng em không chỉ thu được kiến thức chuyên ngành mà còn những góc nhìn thực tế quý báu và lời khuyên quý giá. Phương pháp giảng dạy của thầy không chỉ giúp chúng em tiếp cận với tri thức một cách hiệu quả mà còn tạo ra cơ hội cho chúng em để phát triển khả năng và kiến thức cá nhân.

Dưới sự hướng dẫn của thầy và sự nỗ lực không ngừng của toàn bộ nhóm, chúng em đã kết hợp kiến thức thuần túy từ giảng đường với những kiến thức mới mẻ và kinh nghiệm cá nhân để hoàn thành bài báo cáo. Chúng em trân trọng mọi góp ý, đánh giá chân thành từ thầy cô và các bạn để từ đó hoàn thiện đề tài của chúng em hơn nữa.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

Các sinh viên nhóm 10

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	3
DANH MỤC BẢNG BIỂU	6
DANH MỤC HÌNH VẼ	7
PHẦN I. MỞ ĐẦU	8
1. Tên đề tài	8
2. Lý do chọn đề tài	8
3. Mục đích đề tài	9
4. Mục tiêu đề tài	9
5. Bố cục đề tài	10
6. Phương pháp nghiên cứu	10
PHẦN II. NỘI DUNG	11
Chương 1. Xác định dự án	11
1.1 Giới thiệu công ty	11
1.2 Mục đích dự án	11
1.3 Mục tiêu dự án	11
1.4 Phạm vi dự án	12
1.5 Phác thảo dự án	13
1.6 Danh sách tổ dự án	15
1.7 Ma trận trách nhiệm	15
1.8 Công cụ và môi trường phát triển dự án	17
Chương 2. Lập kế hoạch	18
2.1 Nhân sự dự án	18
2.2 Bảng công việc	20

2.3 Phân bổ nguồn lực và tài nguyên	23
2.4 Ước lượng chi phí	24
2.5 Lập tiến độ thực hiện	28
2.6 Ước lượng rủi ro	28
Chương 3. Quản lý việc thực hiện dự án	37
3.1 Phương pháp thực hiện công việc quản lý	37
3.2 Báo cáo hiện trạng của quản lý dự án	38
Chương 4. Kết thúc dự án	56
4.1 Kết quả dự án	56
4.2 Đánh giá kết quả dự án	60
4.3 Hợp kết thúc dự án	60
PHẦN III. KẾT LUẬN	61
1. Kết quả đạt được	61
2. Hướng phát triển đề tài	61
TÀI LIỆU THAM KHẢO	62

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1 Phác thảo dự án	13
Bảng 1.2 Danh sách tổ dự án	15
Bảng 1.3. Ma trận trách nhiệm	16
Bảng 2.1 Nhân sự dự án	18
Bảng 2.2 Bảng công việc	20
Bảng 2.3 Phân công công việc sơ bộ	23
Bảng 2.4 Ước lượng chi phí tổng quan	24
Bảng 2.5 Ước lượng chi phí cho đội thực hiện dự án	25
Bảng 2.6 Đơn giá cho đội thực hiện	27
Bảng 2.7 Rủi ro về kế hoạch	28
Bảng 2.8 Rủi ro công việc	30
Bảng 3.1 Mốc kiểm soát	39
Bảng 3.2 Biên bản họp lần I	42
Bảng 3.3 Biên bản họp lần II	43
Bảng 3.4 Biên bản họp lần III	45
Bảng 3.5 Biên bản họp lần IV	47
Bảng 3.6 Biên bản họp lần V	49
Bảng 3.7 Biên bản họp lần VI	51
Bảng 3.8 Biên bản họp lần VII	52
Bảng 3.9 Biên bản họp lần VIII	54

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 2.1 Sơ đồ Gantt.....	28
Hình 3.1 Quy trình quản lý	38
Hình 3.2 Sơ đồ quản lý	39
Hình 4.1 Giao diện trang chủ	57
Hình 4.2 Giao diện trang danh sách sản phẩm	57
Hình 4.3 Giao diện trang chi tiết sản phẩm	57
Hình 4.4 Giao diện trang đăng nhập	58
Hình 4.5 Giao diện trang đặt hàng	58
Hình 4.6 Giao diện trang Dashboard	58
Hình 4.7 Giao diện trang quản lý asset	59
Hình 4.8 Giao diện trang quản lý tài khoản người dùng	59
Hình 4.9 Giao diện trang báo cáo và thống kê	59

PHẦN I. MỞ ĐẦU

1. Tên đề tài

Quản lý dự án xây dựng website bán Asset Pixel.

2. Lý do chọn đề tài

Một dự án là tập hợp các công việc được thực hiện bởi một nhóm người nhằm đạt được một mục tiêu cụ thể trong một khoảng thời gian và kinh phí nhất định. Để đảm bảo dự án đạt được mục tiêu đó, yếu tố không thể thiếu chính là quản lý dự án. Quản lý dự án giúp xác định rõ phạm vi, tiến độ, chi phí, chất lượng và rủi ro của dự án, từ đó đảm bảo tính khả thi và hiệu quả trong quá trình thực hiện.

Theo Hiệp hội Quản lý Dự án (Association for Project Management - APM), quản lý dự án là việc áp dụng các quy trình, phương pháp, kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm để đạt được các mục tiêu cụ thể của dự án trong phạm vi, thời gian và ngân sách đã thỏa thuận. Nói cách khác, quản lý dự án chính là “kim chỉ nam” giúp dự án vận hành đúng hướng và đạt được kết quả mong muốn.

Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, quản lý dự án lại càng đóng vai trò quan trọng. Sự thay đổi liên tục của công nghệ, yêu cầu thị trường ngày càng cao và tính phức tạp của các sản phẩm phần mềm khiến việc quản lý dự án trở thành yếu tố then chốt quyết định sự thành công hay thất bại. Nếu không có kế hoạch và quy trình quản lý chặt chẽ, dự án phần mềm dễ gặp tình trạng trễ tiến độ, vượt chi phí, hoặc không đáp ứng đúng yêu cầu của khách hàng.

Đặc biệt, trong bối cảnh thị trường Asset Pixel (tài nguyên đồ họa pixel) đang phát triển mạnh mẽ cùng nhu cầu của các nhà phát triển game độc lập (Indie Game Developer), việc xây dựng một website bán Asset Pixel là rất tiềm năng. Tuy nhiên, để triển khai được một dự án phần mềm như vậy, nhóm cần nắm vững kiến thức về quản lý dự án: từ việc xác định mục tiêu, phân tích yêu cầu, lập kế hoạch, đến thực thi, kiểm soát và đánh giá kết quả.

Nhận thức được tầm quan trọng đó, nhóm tác giả quyết định lựa chọn đề tài **“Quản lý dự án xây dựng Website bán Asset Pixel”** nhằm vận dụng các kiến thức đã học trong học phần **“Quản lý dự án công nghệ thông tin”** vào một dự án thực tế. Thông qua đề tài, nhóm mong muốn được “hóa thân” vào vai trò của những người quản lý dự án thực thụ, học cách tổ chức, lập kế hoạch, giám sát tiến độ và điều phối nguồn lực một cách hiệu quả.

Đồng thời, việc lựa chọn đề tài này còn giúp nhóm có cái nhìn thực tế hơn về quy trình phát triển phần mềm, cách làm việc nhóm, phân tích rủi ro, và đánh giá kết quả — những yếu tố then chốt để đảm bảo thành công của bất kỳ dự án công nghệ nào.

3. Mục đích đề tài

Như đã đề cập ở trên, mục đích chính của đề tài **“Quản lý dự án xây dựng website bán Asset Pixel”** là vận dụng những kiến thức và kỹ năng đã được học trong học phần Quản lý dự án Công nghệ thông tin vào việc xây dựng và quản lý một dự án phần mềm thực tế.

4. Mục tiêu đề tài

- Tìm kiếm được dự án thực tế để có điều kiện trải nghiệm thực tế.
- Xây dựng “tài liệu phác thảo dự án”.
- Lập được bản kế hoạch quản lý dự án.
- Hiểu được bảng phân vai trong thành phần liên quan tới dự án.
- Lập tiến độ thực hiện công việc.
- Xây dựng được ma trận trách nhiệm.
- Lập kế hoạch thực hiện dự án.
- Biết cách ước lượng sử dụng các tài nguyên của dự án.
- Biết cách phân bổ lực lượng tài nguyên trong dự án.
- Biết cách ước tính, tính chi phí thực thi trong dự án.
- Tổ chức các cuộc họp một cách hiệu quả.
- Kiểm soát, dự đoán được các rủi ro xảy ra với dự án, lên kế hoạch để kiểm soát và xử lý được các rủi ro xảy ra.
- Kiểm soát được tình hình thay đổi, sẵn sàng ứng phó với tình hình đó.

- Hoàn thiện dự án thành công, biết cách kết thúc dự án.

5. Bố cục đề tài

Nội dung chính đề tài gồm 4 chương:

Chương 1: Xác định dự án

Chương này giới thiệu, xác định phạm vi của dự án và trách nhiệm của những người tham dự. Là cơ sở thống nhất ý kiến trong số những bên tham gia dự án. Xác định được các khoảng thời gian, thống nhất chi phí và công cụ để thực hiện dự án.

Chương 2: Lập kế hoạch thực hiện dự án

Xây dựng bảng công việc nhằm chỉ ra chi tiết các công việc cần làm. Bên cạnh đó, cần thực hiện các ước lượng về: thời gian, tiến độ, chi phí, nguồn lực và rủi ro mà dự án có thể đối mặt.

Chương 3: Quản lý việc thực hiện dự án

Giám sát và kiểm soát, đánh giá các công việc. Lập bảng tiến độ công việc để kiểm tra, đôn đốc các thành viên thực hiện công việc của mình một cách hiệu quả.

Chương 4: Kết thúc dự án

Bàn giao sản phẩm cho khách hàng, giải thể và kết thúc dự án.

6. Phương pháp nghiên cứu

- Khảo sát thực tế, tìm hiểu, phỏng vấn, điều tra lấy thông tin yêu cầu của khách hàng.
- Tìm hiểu thêm thông tin trên mạng.
- Ghi chép tài liệu thu thập được trên giấy và máy tính.
- Sử dụng các công cụ hỗ trợ quản lý.
- Xây dựng kế hoạch công việc bằng cách sử dụng công cụ Microsoft Project.
- Sử dụng sơ đồ GANTT.

PHẦN II. NỘI DUNG

Chương 1. Xác định dự án

1.1 Giới thiệu công ty

- Tên đầy đủ công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN PIXELMART.
- Địa chỉ: Số 298, đường Cầu Diễn, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Ngày thành lập: 03/06/1998.
- Tôn chỉ của công ty: Luôn đặt quyền lợi khách hàng lên hàng đầu.
- Mục đích, mục tiêu hoạt động: Mang đến cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tin học chất lượng cao, cùng trải nghiệm mua sắm tiện lợi và chuyên nghiệp.
- Lĩnh vực hoạt động: Phân phối tài nguyên trên mạng.
- Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp game và đồ họa, công ty PIXELMART nhận thấy nhu cầu ngày càng tăng về tài nguyên đồ họa dạng Pixel (Pixel Assets), đặc biệt là từ các nhà phát triển game độc lập (Indie Developers), các studio thiết kế và cộng đồng sáng tạo nội dung số. Tuy nhiên, việc mua bán và chia sẻ các tài nguyên này vẫn còn rời rạc, thiếu một nền tảng tập trung và chuyên nghiệp.
- Chính vì vậy, dự án “Xây dựng website bán Asset Pixel” được hình thành với mục tiêu tạo ra một nền tảng trực tuyến cho phép người dùng đăng tải, mua bán và quản lý các sản phẩm đồ họa Pixel một cách dễ dàng, an toàn và hiệu quả.

1.2 Mục đích dự án

- Áp dụng kiến thức đã học vào việc lập kế hoạch, triển khai và giám sát một phần mềm dự án thực tế.
- Tạo ra sản phẩm đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong việc quản lý và bán các gói Asset Pixel hiệu quả, tiện lợi và chuyên nghiệp

1.3 Mục tiêu dự án

Yêu cầu về phía người sử dụng:

- Giao diện đẹp, thân thiện phù hợp với yêu cầu khách hàng.
- Dễ sử dụng với các đối tượng người dùng, thuận tiện trong quản trị, dễ bảo trì.
- Thông tin hiển thị chi tiết.
- Chạy ổn định trên tất cả các máy tính.
- Hoàn thành sản phẩm đúng thời gian quy định.

Yêu cầu về chức năng:

- Dễ dàng tùy chỉnh, thay đổi các module, có khả năng tích hợp nhiều thành phần.
- Truy xuất và cập nhập dữ liệu nhanh.
- Có tính hiệu quả cao.
- Có tính bảo mật cao.
- Yêu cầu tính hợp pháp và bản quyền.

Các module yêu cầu cho Website bán Asset Pixel:

- Module hệ thống
- Module quản lý tài khoản
- Module quản lý sản phẩm
- Module tìm kiếm và duyệt sản phẩm
- Module giỏ hàng và thanh toán
- Module đánh giá sản phẩm
- Module thống kê báo cáo
- Module thanh toán trực tuyến

1.4 Phạm vi dự án

- Ranh giới của dự án: Sản phẩm được phát triển theo yêu cầu của khách hàng.
- Sản phẩm chính: Phần mềm quản lý bán Asset Pixel và tài liệu hướng dẫn sử dụng.
- Các yếu tố được đưa vào dự án: Thông tin từ phía khách hàng.
- Các yếu tố được đưa ra ngoài dự án: Loại bỏ các yếu tố ảnh hưởng đến khách hàng.

1.5 Phác thảo dự án

Bảng 1.1 Phác thảo dự án

STT	Tiêu đề	Nội dung	
1	Tên dự án	Xây dựng website bán Asset Pixel	
2	Mã dự án	DA010	
3	Thời gian thực hiện	30 ngày	
		Ngày bắt đầu: 4/11/2025	Ngày kết thúc: 3/12/2025
4	Chủ đầu tư	– Công ty cổ phần PixelMart – Đại diện: Ông Nguyễn Thái Hoàng - Giám đốc điều hành công ty cổ phần PixelMart – Số điện thoại liên hệ: 094.444.333 – Địa chỉ: Số 298, đường Cầu Diễn, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội	
5	Tổng đầu tư	50.000.000 VNĐ	
6	Ban lãnh đạo	Nguyễn Đức Lưu	
7	Người quản lý	Nguyễn Anh Tuấn	
8	Phạm vi	– Ranh giới của dự án: Sản phẩm được phát triển theo yêu cầu của khách hàng – Sản phẩm chính: Phần mềm quản lý bán Asset Pixel và tài liệu hướng dẫn sử dụng.	

		– Các yếu tố được đưa vào dự án: Thông tin từ phía khách hàng. – Các yếu tố được đưa ra ngoài dự án: Loại bỏ các yếu tố ảnh hưởng đến khách hàng.
9	Mục đích dự án	Mục đích của dự án “Quản lý dự án xây dựng Website bán Asset Pixel” là áp dụng các kiến thức đã học trong học phần “Quản lý dự án Công nghệ thông tin” vào việc lập kế hoạch, triển khai và giám sát một dự án phần mềm thực tế, đồng thời tạo ra sản phẩm đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong việc quản lý và bán các gói Asset Pixel hiệu quả, tiện lợi và chuyên nghiệp.
10	Mục tiêu dự án	➤ Yêu cầu về phía người sử dụng: – Giao diện đẹp, thân thiện phù hợp với yêu cầu khách hàng. – Dễ sử dụng với các đối tượng người dùng, thuận tiện trong quản trị, dễ bảo trì. – Thông tin hiển thị chi tiết. – Chạy ổn định trên tất cả các máy tính. – Hoàn thành sản phẩm đúng thời gian quy định. ➤ Yêu cầu về chức năng: – Dễ dàng tùy chỉnh, thay đổi các module, có khả năng tích hợp nhiều thành phần.

		– Truy xuất và cập nhập dữ liệu nhanh. – Có tính hiệu quả cao. – Có tính bảo mật cao. – Yêu cầu tính hợp pháp và bản quyền. ➤ Các module yêu cầu cho website bán asset pixel: – Module quản lý tài khoản – Module quản lý sản phẩm – Module tìm kiếm và duyệt sản phẩm – Module giỏ hàng và thanh toán – Module đánh giá sản phẩm – Module thống kê báo cáo – Module thanh toán trực tuyến
--	--	---

1.6 Danh sách tổ dự án

Bảng 1.2 Danh sách tổ dự án

Họ và tên	Chức vụ
Nguyễn Anh Tuấn	Quản lý dự án
Ngô Hữu Tùng	Nhóm trưởng
Nguyễn Hữu Tú	Nhân Viên
Lê Hải Quang	Nhân Viên
Nguyễn Văn Đại	Nhân Viên

1.7 Ma trận trách nhiệm

Dự án bao gồm:

- Người quản lý
- Nhóm khảo sát, phân tích hệ thống
- Nhóm lập trình

- Nhóm thiết kế giao diện
- Nhóm kiểm thử

Trong đó trách nhiệm của các nhóm và người quản lý được làm rõ trong bảng ma trận trách nhiệm sau:

Bảng 1.3. Ma trận trách nhiệm

Người thực hiện công việc	Khảo sát	Phân tích	Thiết kế cơ sở dữ liệu	Thiết kế giao diện	Lập trình và tích hợp hệ thống	Kiểm thử và sửa lỗi	Kết thúc dự án
Người quản lý dự án	A, R	A, R	A	A	A	A, C	P
Nhóm khảo sát, phân tích hệ thống	P	P	P	C	C	R	P
Nhóm lập trình		C	C	C	P	P	I
Nhóm thiết kế giao diện				P		I	I
Nhóm kiểm thử	C	C	C	C	C	P	I

Chú thích:

Các kiểu trách nhiệm khác nhau trong công việc

- A (Approving): Xét duyệt
- P (Performing): Thực hiện
- R (Reviewing): Thẩm định

- C (Contributing): Tham gia đóng góp
- I (Informing): Báo cho biết

1.8 Công cụ và môi trường phát triển dự án

- Công cụ làm việc của các thành viên trong nhóm: máy tính cấu hình cao Pentium 4 trở lên, các phần mềm hỗ trợ khác.
- Hệ điều hành Windows 10.
- Các phần mềm công cụ :
 - Visual Studio Code
 - IntelliJ
 - MS Office
 - MS Project
- Môi trường Test:
 - Máy tính dùng cho test có cấu hình tương đương với khách hàng
 - Tài liệu các quy trình test
 - Các nền test Windows 10
 - Cơ sở dữ liệu sử dụng MS SQL Server 2018

Chương 2. Lập kế hoạch

2.1 Nhân sự dự án

Sơ yếu lý lịch từng thành viên trong dự án

Bảng 2.1 Nhân sự dự án

STT	Họ tên	Mô tả
1	Nguyễn Anh Tuấn	– Ngày sinh: 05/10/1995 – Địa chỉ: Bắc Từ Liêm, Hà Nội – Email: nat510@gmail.com – SĐT: 0123456789 – Bằng cấp: Kỹ sư Công nghệ thông tin – Ngoại Ngữ: Tiếng Anh IELTS 8.0 – Kinh Nghiệm Chuyên Môn: Chuyên môn 2 năm kinh nghiệm làm Software Engineer và 4 năm kinh nghiệm làm quản lý các dự án tại Công ty VNG.
2	Ngô Hữu Tùng	– Ngày sinh: 07/04/2000 – Địa chỉ: Đông Anh – Email: tung07@gmail.com – SĐT: 0123456789 – Bằng cấp: Cử nhân Công nghệ thông tin – Ngoại Ngữ: Tiếng Anh IELTS 7.0 – Kinh Nghiệm Chuyên Môn: 2 năm kinh nghiệm làm Business Analyst, 3 năm kinh nghiệm làm lập trình viên tại công ty FPT Software
3	Nguyễn Hữu Tú	– Ngày sinh: 01/01/2000 – Địa chỉ: Bắc Từ Liêm, Hà Nội – Email: tu0101@gmail.com

		– SĐT: 0123456789 – Bằng cấp: Cử nhân Công nghệ thông tin – Kinh Nghiệm Chuyên Môn: Chuyên môn 3 năm kinh nghiệm làm nhân viên kiểm thử tại công ty cổ phần MISA
4	Lê Hải Quang	– Ngày sinh: 01/01/1998 – Địa chỉ: Bắc Ninh – Email: haiquang24@gmail.com – SĐT: 0123456789 – Bằng cấp: Cử nhân Công nghệ thông tin – Ngoại Ngữ: TOEIC 750 – Kinh Nghiệm Chuyên Môn: Chuyên môn 1 năm kinh nghiệm làm lập trình viên tại công ty cổ phần viễn thông Tinh Vân
5	Nguyễn Văn Đại	– Ngày sinh: 01/01/1997 – Địa chỉ: Nam Từ Liên, Hà Nội – Email: nvdai97@gmail.com – SĐT: 0123456789 – Bằng cấp: Cử nhân Công nghệ thông tin – Kinh Nghiệm Chuyên Môn: Chuyên môn 3 năm kinh nghiệm làm lập trình viên tại công ty VNPT

Quy tắc làm việc:

- Mọi sự phân công đề được đưa ra họp bản công khai
- Ưu tiên phân công theo năng lực sở trường của mỗi người

Yêu cầu với các thành viên:

- Nghiêm chỉnh chấp hành thực hiện công việc theo bản kế hoạch của dự án

- Tích cực tham gia thảo luận phát biểu ý kiến để dự án đạt kết quả tốt nhất
- Bồi dưỡng khả năng chuyên môn để hoàn thành tốt vai trò của mình trong dự án
- Tham gia đầy đủ các buổi họp
- Nghi làm phải thông báo tới giám đốc dự án hoặc nhóm trưởng

Truyền thông:

- Trao đổi qua email, điện thoại.
- Họp nhóm khi cần và theo kế hoạch truyền thông

Cuộc họp:

- Có mặt đầy đủ đúng giờ các buổi họp nhóm dự án
- Tích cực, khẩn trương trao đổi, bàn bạc giải quyết các vấn đề của dự án
- Chấp hành thực hiện đúng quyết định, giải pháp đã thống nhất trong cuộc họp

2.2 Bảng công việc

Bảng 2.2 Bảng công việc

STT	Tên Công việc
1	Quản lý nhân sự Khởi động dự án
	Gặp gỡ khách hàng
	Thu thập thông tin
	Phác thảo dự án
	Lập kế hoạch
	Tính chi phí
	Quản lý rủi ro

2	Khảo sát
	Quan sát
	Phỏng vấn
	Điều tra thăm dò
3	Phân tích và xác định yêu cầu
	Yêu cầu chức năng nghiệp vụ
	Yêu cầu phi chức năng
	Yêu cầu phần cứng
	Yêu cầu phần mềm
	Yêu cầu người sử dụng
4	Thiết kế chức năng
	Quản lý tài khoản
	Quản lý sản phẩm
	Tìm kiếm và duyệt sản phẩm
	Giỏ hàng và thanh toán
	Thống kê báo cáo
5	Thiết kế CSDL
	CSDL tài khoản
	CSDL sản phẩm

	Các ràng buộc, khóa
6	Thiết kế giao diện
	Thiết kế giao diện chính
	Thiết kế module tài khoản
	Thiết kế module quản lý
	Thiết kế module tìm kiếm
	Thiết kế module giỏ hàng
7	Lập trình và tích hợp hệ thống
	Xây dựng CSDL
	Lập trình module tài khoản
	Lập trình module quản lý
	Lập trình module tìm kiếm
	Lập trình module giỏ hàng
8	Kiểm thử
	Kiểm thử mức đơn vị
	Kiểm thử tích hợp
	Kiểm thử mức hệ thống
	Test Giao diện
	Sửa lại các lỗi mắc phải khi kiểm thử

	Kiểm thử lại và sửa hoàn chỉnh các lỗi
9	Kết thúc dự án
	Làm tài liệu hướng dẫn
	Bàn giao sản phẩm
	Phân công bảo trì
	Đào tạo

2.3 Phân bố nguồn lực và tài nguyên

Bảng 2.3 Phân công công việc sơ bộ

STT	Thành viên nhóm	Công việc chính
1	Nguyễn Anh Tuấn Ngô Hữu Tùng	Khởi động dự án
2	Ngô Hữu Tùng	Khảo sát
3	Ngô Hữu Tùng	Phân tích và xác định yêu cầu
4	Ngô Hữu Tùng	Thiết kế chức năng
5	Ngô Hữu Tùng	Thiết kế CSDL
6	Nguyễn Hữu Tú	Thiết kế giao diện
7	Lê Hải Quang Nguyễn Văn Đại	Lập trình và tích hợp hệ thống
8	Nguyễn Hữu Tú Lê Hải Quang	Kiểm thử
9	Nguyễn Anh Tuấn	Kết thúc dự án

	Ngô Hữu Tùng	
--	--------------	--

2.4 Ước lượng chi phí

- Chi phí tổng quan

Bảng 2.4 Ước lượng chi phí tổng quan

STT	Hạng mục	Chi Tiết	Thành Tiền (VNĐ)
1	Đội dự án	Chi phí cho đội thực hiện dự án	20.800.000
2	Văn Phòng	Chi phí đầu tư thuê địa điểm văn phòng	8.000.000
3	Máy Móc	Chi phí đầu tư cho máy móc, thiết bị	10.000.000
4	Hội Họp	Chi phí cho tổ chức họp, tiếp khách	3.000.000
5	Tài Liệu	Chi phí cho mua các tài liệu tham khảo, các tài liệu cho khách hàng	1.000.000
6	Đi lại	Chi phí cho quá trình đi lại của đội Dự án	2.200.000
7	Chi phí dự phòng	Dự phòng các chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện dự án	5.000.000
Tổng			50.000.000 VNĐ

- Chi phí cho đội thực hiện dự án

Bảng 2.5 Ước lượng chi phí cho đội thực hiện dự án

Chi tiết	Số giờ	Thành tiền
Khởi động dự án	3 days	4.680.000
Gặp gỡ khách hàng	4 hrs	780.000
Thu thập thông tin	8 hrs	1.560.000
Phác thảo dự án	4 hrs	780.000
Lập kế hoạch	4 hrs	780.000
Tính chi phí	2 hrs	390.000
Quản lý rủi ro	2 hrs	390.000
Khảo sát	3 days	2.040.000
Quan sát	8 hrs	680.000
Phỏng vấn	8 hrs	680.000
Điều tra thăm dò	8 hrs	680.000
Phân tích và xác định yêu cầu	2 days	1.360.000
Yêu cầu chức năng nghiệp vụ	4 hrs	340.000
Yêu cầu phi chức năng	4 hrs	340.000
Yêu cầu phần cứng	2 hrs	170.000
Yêu cầu phần mềm	2 hrs	170.000
Yêu cầu người sử dụng	4 hrs	340.000
Thiết kế chức năng	3 days	2.040.000
Quản lý tài khoản	6 hrs	510.000
Quản lý sản phẩm	6 hrs	510.000
Tìm kiếm và duyệt sản phẩm	4 hrs	340.000
Giỏ hàng và thanh toán	6 hrs	510.000

Thông kê báo cáo	2 hrs	170.000
Thiết kế CSDL	1 days	1.020.000
CSDL tài khoản	4 hrs	340.000
CSDL sản phẩm	4 hrs	340.000
Các ràng buộc, khóa	4 hrs	340.000
Thiết kế giao diện	3 days	1.680.000
Thiết kế giao diện chính	6 hrs	420.000
Thiết kế module tài khoản	4 hrs	280.000
Thiết kế module quản lý	6 hrs	420.000
Thiết kế module tìm kiếm	4 hrs	280.000
Thiết kế module giỏ hàng	4 hrs	280.000
Lập trình và tích hợp hệ thống	3,5 days	2.880.000
Xây dựng CSDL	4 hrs	360.000
Lập trình module tài khoản	8 hrs	720.000
Lập trình module quản lý	8 hrs	720.000
Lập trình module tìm kiếm	4 hrs	360.000
Lập trình module giỏ hàng	8 hrs	720.000
Kiểm thử	5 days	2.760.000
Kiểm thử đơn vị	8 hrs	600.000


Kiểm thử mức tích hợp	8 hrs	600.000
Kiểm thử mức hệ thống	8 hrs	600.000
Test giao diện	4 hrs	300.000
Sửa lại các lỗi mắc phải khi kiểm thử	6 hrs	180.000
Kiểm thử lại và sửa hoàn chỉnh các lỗi	6 hrs	480.000
Kết thúc dự án	1.5 days	2.340.000
Làm tài liệu hướng dẫn	4 hrs	780.000
Bàn giao sản phẩm	2 hrs	390.000
Phân công bảo trì	2 hrs	390.000
Đào tạo	4 hrs	780.000

– Đơn giá cho đội thực hiện

Bảng 2.6 Đơn giá cho đội thực hiện

Tên nhân công	Loại	Trong giờ hành chính (đ/giờ)	Ngoài giờ hành chính (đ/giờ)
Nguyễn Anh Tuấn	Work	110.000	140.000
Ngô Hữu Tùng	Work	85.000	105.000
Nguyễn Hữu Tú	Work	90.000	120.000
Lê Hải Quang	Work	70.000	90.000
Nguyễn Văn Đại	Work	75.000	95.000

2.5 Lập tiến độ thực hiện

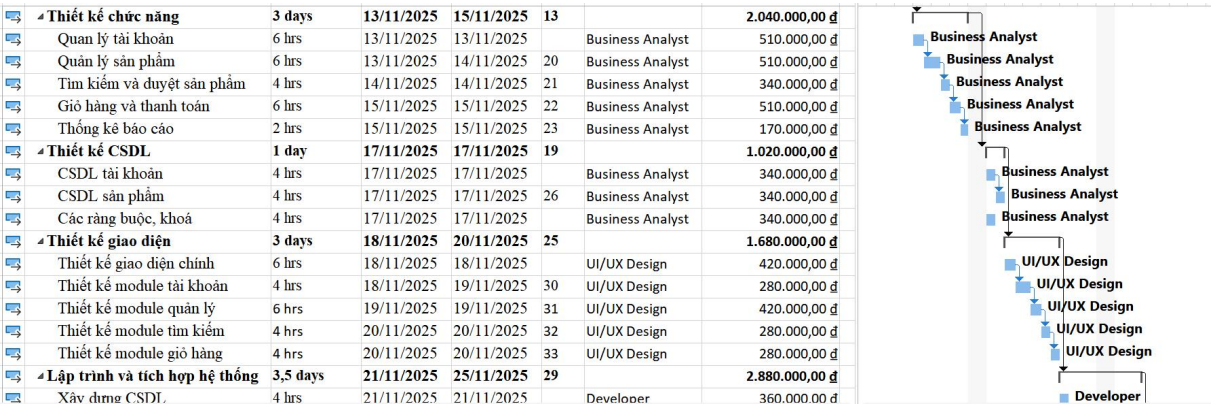

Hình 2.1 Sơ đồ Gantt

2.6 Ước lượng rủi ro

Rủi ro dự án là một sự kiện hoặc sự cố có thể ảnh hưởng tiêu cực đến dự án. Với mỗi dự án thì luôn có rủi ro xảy ra. Việc xác định được rủi ro và phòng ngừa nó quyết định tới thành công của dự án. Dưới đây là các bảng ước lượng các rủi ro của dự án.

2.6.1 Rủi ro về kế hoạch

Bảng 2.7 Rủi ro về kế hoạch

STT	Mô tả	Giả thiết	Xác suất	Ảnh hưởng	Khắc phục
1	Phân công công việc trong dự án không hợp lý	Khi thực hiện kế hoạch có nhiều phát sinh so với dự kiến	1%	Kết quả công việc sẽ không đạt được mức cao nhất, không phát huy được các thế mạnh của các cá nhân trong 1% đội thực hiện dự án dẫn đến có thể không hoàn	Liên tục điều chỉnh kế hoạch để phù hợp với những phát sinh

				thành được theo đúng kế hoạch	
2	Ước lượng thời gian không chuẩn	Khi thực hiện kế hoạch có nhiều phát sinh so với dự kiến	1%	Không hoàn thành được theo đúng kế hoạch	Liên tục điều chỉnh kế hoạch để phù hợp với những phát sinh
3	Chi phí ước tính không chuẩn	Khi thực hiện có nhiều phát sinh so với dự kiến	0.5%	Không đủ kinh phí chi trả cho các hoạt động của dự án	Nâng cao kinh phí dự trù, tăng trợ cấp cho các hoạt động đáp ứng được những nhu cầu cần thiết nhất khi thực hiện dự án
4	Kế hoạch dự án không hợp lý	Khi thực hiện kế hoạch có nhiều phát sinh so với dự kiến	1%	Không hoàn thành được theo đúng kế hoạch	Liên tục điều chỉnh kế hoạch cả về thời gian thực hiện và tiến trình các công việc cần thực hiện (sắp xếp một cách khoa học các

					công việc cần làm) để phù hợp với những phát sinh
5	Người quản lý dự án chưa sát sao với từng bước đi trong kế hoạch dự án	Người quản lý dự án không tập trung thời gian nhiều cho dự án dẫn đến lơ là và không sát sao trong từng giai đoạn của dự án	0.5%	Không hoàn thành được theo đúng kế hoạch thực hiện dự án dẫn đến kế hoạch sẽ không được kiểm soát dẫn đến rất dễ đổ vỡ dự án	Người quản lý dự án phải luôn dành thời gian quan tâm đến kết quả dự án trong từng giai đoạn cụ thể của dự án để có những sự điều chỉnh thích hợp

2.6.2 Rủi ro công việc

Bảng 2.8 Rủi ro công việc

STT	Mô tả	Giả thiết	Xác Suất	Ảnh hưởng	Phản Ánh
1	Nhân lực thực hiện dự án bị thiếu so với dự kiến ban đầu.	Trong đội thực hiện dự án có người bỏ việc hoặc có người bị ốm hoặc vì một lý do nào đó một	0.1%	Không hoàn thành được các phần việc theo đúng kế hoạch	Bổ sung nhân lực từ nhóm dự phòng và điều chỉnh hợp lý công việc cho từng người.

		số thành viên không thể tham gia thực hiện dự án.			
2	Sự phối hợp giữa các cá nhân trong nhóm không tốt.	Công việc của dự án là do một tập thể làm, vì thế vấn đề về sự đoàn kết, sự phối hợp giữa các thành viên trong nhóm cần phải được chú trọng.	1%	Không hoàn thành được theo đúng kế hoạch dẫn đến vỡ dự án	- Hợp và trao đổi định kỳ giữa các thành viên trong nhóm. - Yêu cầu báo cáo kết quả định kỳ để nắm bắt tình hình. - Người quản lý dự án phải có sự điều chỉnh nhất định đối với từng giai đoạn phát triển dự án.
3	Sự chuyển giao công việc giữa các nhóm không có sự ăn khớp.	Thực hiện công việc	1%	Không hoàn thành được các phần việc	Cần phải có một quy trình làm việc thống nhất giữa các đội thực hiện dự án.

4	Xác định yêu cầu về sản phẩm chưa đúng	Thực hiện công việc thu thập và khảo sát các yêu cầu từ phía khách hàng không được tốt dẫn đến hiểu sai về các chức năng và các yêu cầu sản phẩm cần có.	0.5%	Sản phẩm không đảm bảo được yêu cầu của khách hàng	Liên tục trao đổi với khách hàng để xác định yêu cầu của khách hàng.
5	Không gặp gỡ được Khách hàng khi có vấn đề cần trao đổi.	Thực hiện công việc	1%	Không hiểu được các yêu cầu cũng như những vấn đề về sản phẩm mà khách hàng yêu cầu.	Luôn bám sát được các yêu cầu của khách hàng, cần phải có những thông tin cụ thể của khách hàng để khi muốn trao đổi ta có thể liên lạc một cách thuận lợi nhất.
6	Không lấy	Thực hiện	1%	Hệ thống	Đề nghị khách

	được các dữ liệu mẫu cũng như các mẫu biểu cần thiết liên quan đến các yêu cầu của hệ thống.	công việc		không thể kết xuất ra được những mẫu biểu cần thiết, hoặc phân tích CSDL không đúng.	hàng đưa ra những mẫu biểu cần thiết, những yêu cầu dữ liệu mẫu để có thể test thử các chức năng của hệ thống.
7	Thiếu các kỹ thuật về công nghệ và ý tưởng khi triển khai sản phẩm	Người quản lý dự án chưa hình dung được các công việc cần làm của dự án, từ đó để đưa ra được các công nghệ cũng như kỹ thuật yêu cầu khi thực hiện dự án.	1%	Những người làm dự án sẽ phải mất thời gian để tìm hiểu công nghệ sử dụng để thực hiện dự án, điều này có thể làm cho dự án bị chậm tiến độ, gây ra sự chán nản cho đội thực hiện dự án.	Người quản lý dự án phải nắm rất chắc các công nghệ, kỹ thuật sử dụng ngay từ bước đầu thực hiện dự án để có được những sự thành công nhất định khi thực hiện dự án.

8	Giá cả các thiết bị kỹ thuật tăng lên quá so với dự kiến	Khi mua thiết bị	0.5%	Không kiểm tra được giá cả, chi phí của các thiết bị cần thiết để thực hiện dự án.	Tiết kiệm và khắc phục vấn đề phải đầu tư các thiết bị mới.
9	Khi hoàn thành các phân hệ nhưng chưa gặp được khách hàng để bàn giao được cho khách hàng.	Khi hoàn thành các phân hệ (module chương trình con)	0.1%	Không ghi nhận được các lỗi từ phía người dùng cuối dẫn đến sản phẩm khi hoàn thành nhưng không đảm bảo được yêu cầu đã đặt ra.	Liên tục liên hệ với khách hàng khi cần thiết, tại mỗi giai đoạn cần phải test các module chức năng của hệ thống đáp ứng được yêu cầu khách hàng.
10	Không đồng bộ được	Các thành phần riêng giao cho các thành viên thực hiện có sự sai lệch đáng kể dẫn	20%	Không thể hoàn thành dự án hoàn chỉnh được	Tìm hiểu nguyên nhân, cố gắng khắc phục trong thời gian ngắn nhất, nếu cần có thể phát triển lại

		đến không thể ghép chung lại thành sản phẩm hoàn chỉnh được phát sinh nhiều lỗi phức tạp.			trên nền sẵn có.
11	Lỗi	Ghép được các module nhưng có quá nhiều lỗi hoặc sai sót	10%	Giảm chất lượng của phần mềm	Thắt chặt kiểm thử và thay đổi thiết kế cho phù hợp
12	Nhân sự trực trực	Có thành viên nào đó không thể tiếp tục tham gia dự án vì một lý do cá nhân nào đó	10%	Ảnh hưởng tới tiến độ và nội dung của dự án	Không thể tìm thêm thành viên, phải báo cáo lại với chủ đầu tư hoặc tự gánh vác các phần việc còn lại
13	Không kịp thời hạn	Các thành viên khó sắp xếp được công việc	40%	Không đáp ứng về mặt thời hạn dự án, dẫn đến	Thường xuyên họp nhóm và thúc đẩy tiến độ làm việc,

		riêng dẫn đến không làm xong việc được phân công trong thời hạn cho phép		giảm chất lượng dự án nghiêm trọng, có thể dẫn tới thất bại	đòi hỏi các thành viên báo cáo tiến độ định kỳ mỗi tuần
14	Nghiệm thu sản phẩm chậm hơn dự kiến	Sau khi hoàn thành nhưng không bàn giao được sản phẩm cho khách hàng	0.1%	Không thanh lý hợp đồng được theo đúng dự kiến	Căn cứ kế hoạch và hợp đồng đề nghị thanh lý hợp đồng.
15	Đồng tiền trượt giá	Khi thanh lý hợp đồng	0.1%	Kinh phí không đủ để thanh toán cho dự án	Nâng mức dự trù kinh phí cho rủi ro.

Chương 3. Quản lý việc thực hiện dự án

3.1 Phương pháp thực hiện công việc quản lý

Trong quá trình xây dựng dự án “Xây dựng website bán Asset Pixel”, nhóm áp dụng các phương pháp quản lý sau nhằm đảm bảo dự án được triển khai đúng tiến độ, đạt chất lượng và hạn chế rủi ro phát sinh:

- Thu thập và đánh giá hiện trạng: việc thu thập và đánh giá hiện trạng được thực hiện thông qua:
 - Các báo cáo tiến độ công việc của từng thành viên
 - Biên bản họp nhóm định kỳ và đột xuất
- Từ các tài liệu này, người quản lý dự án tiến hành tổng hợp, phân tích, đánh giá mức độ hoàn thành so với kế hoạch ban đầu, từ đó tư vấn và đề xuất các giải pháp phù hợp cho các bước thực hiện tiếp theo.
- Tổ chức họp: các cuộc họp được tổ chức một cách khoa học nhằm nâng cao hiệu quả làm việc nhóm, bao gồm:
 - Các cuộc họp định kỳ để kiểm tra tiến độ, trao đổi công việc.
 - Các cuộc họp đột xuất khi xuất hiện vấn đề hoặc rủi ro.
 - Nội dung họp được chuẩn bị trước, có biên bản ghi nhận và kết luận rõ ràng để làm cơ sở triển khai sau họp.
- Quản lý cấu hình: là công việc thu thập, lưu trữ các phiên bản sản phẩm của các công việc thực hiện được.
- Quản lý chất lượng: là việc quản lý sự hài hòa các yếu tố mục đích, phương pháp, thực hiện. Khi một công việc được bổ nhiệm cho 1 nhóm mà không thực hiện có chất lượng tốt thì người quản lý sẽ xem xét đưa ra sự thay đổi trong việc quản lý dự án.
- Quản lý rủi ro: rủi ro được theo dõi và phân tích thông qua:
 - Nhật ký rủi ro
 - Các bảng phân tích đánh giá mức độ ảnh hưởng và khả năng xảy ra rủi ro.

- Từ đó, người quản lý dự án có thể chủ động đề xuất các cuộc họp đột xuất để thảo luận và đưa ra phương án xử lý rủi ro kịp thời, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng dự án.
- Lập lại kế hoạch: khi có yêu cầu sửa đổi từ khách hàng, hay có sự ảnh hưởng của rủi ro, lập lại kế hoạch giúp vẫn đáp ứng được nhu cầu của dự án.

3.2 Báo cáo hiện trạng của quản lý dự án


3.2.1 Quy trình quản lý

Người quản lý dự án dùng mọi phương sách để xác định xem các công việc (nói riêng) và toàn bộ dự án (nói chung) hiện nay đang tiến triển thế nào.

Sau khi hoàn thành 1 công việc thì người thực hiện sẽ có báo cáo cho người quản lý dự án, đồng thời nhóm trưởng sẽ tổng hợp tiến độ công việc này. Nếu chưa hoàn thành sẽ có báo cáo chi tiết vào những buổi họp thường xuyên đã được xác định trong dự án.

Người quản lý dự án luôn luôn phải sát sao với từng giai đoạn của dự án, tại các thời điểm của các giai đoạn nhất định, trưởng nhóm sẽ tổng hợp để báo cáo tiến độ công việc cho người quản lý dự án. Tài liệu tại các mốc là các báo cáo của trưởng nhóm và biên bản các cuộc họp.

Dưới đây là luồng công việc trong quá trình quản lý và kiểm soát dự án. Từ đây chúng ta có thể có cái nhìn khách quan nhất về việc thực hiện 1 dự án khi mới bắt đầu cho đến lúc kết thúc dự án.

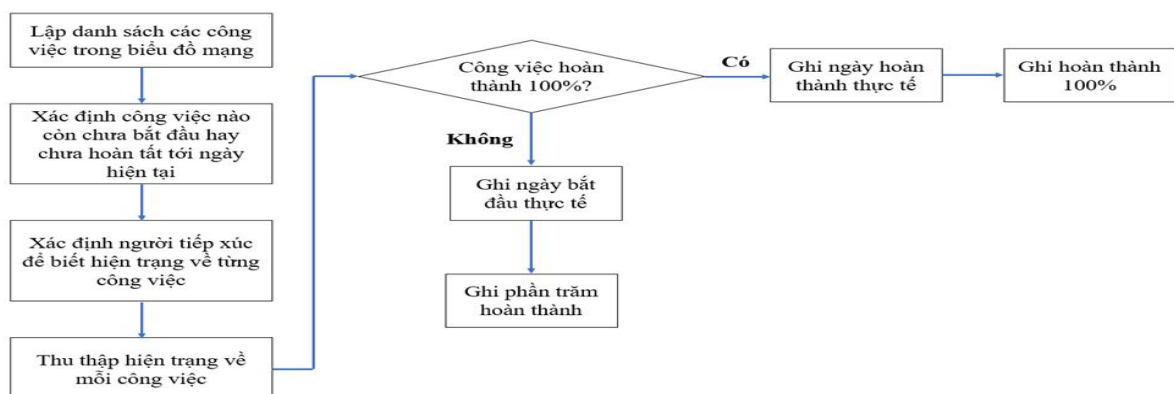

Hình 3.1 Quy trình quản lý


Đối với việc thu thập vào đánh giá hiện trạng thì cần:

- Xác định định kỳ cần báo cáo kết quả công việc của từng nhân sự trong tổ dự án.
- Thu thập hiện trạng từ mọi thành viên của tổ dự án.
- Làm tài liệu tổng hợp các dữ liệu đã thu thập được.

Sau khi thu thập cần phải đưa ra đánh giá đối với tình trạng hiện tại. Xác định các công việc đã hoàn thành, các công việc sắp tới, điều chỉnh nếu cần thiết và hãy ghi lại đầy đủ thông tin cập nhật bổ sung.

3.2.2 Các mốc kiểm soát

3.2.2.1 Sơ đồ quản lý

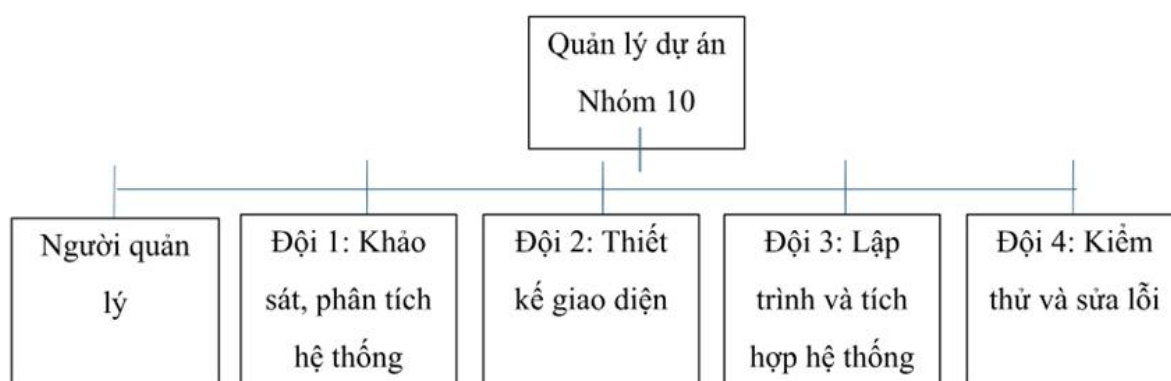

Hình 3.2 Sơ đồ quản lý

3.2.2.2 Mốc kiểm soát

Bảng 3.1 Mốc kiểm soát

STT	Giai đoạn	Ngày báo cáo	Tài liệu	Trách nhiệm
1	Hợp nhận dự án	1/11/2025	Gặp gỡ khách hàng và nhận dự án	Người quản lý dự án
2	Khởi động dự án	4/11/2025	Thu nhập thông tin, phác thảo dự án, lập kế hoạch, tính chi phí	Người quản lý dự án

3	Khảo sát	7/11/2025	- Quan sát, phỏng vấn, điều tra thăm dò - Báo cáo tiến độ	Đội 1
4	Phân tích chức năng và thiết kế hệ thống	11/11/2025	- Xác định chức năng của hệ thống theo yêu cầu - Báo cáo tiến độ	Đội 1
5	Thiết kế chức năng	13/11/2025	- Thực hiện thiết kế chức năng theo yêu cầu của khách hàng, theo bản đặc tả dựa trên kết quả khảo sát. - Báo cáo tiến độ	Đội 1
6	Thiết kế cơ sở dữ liệu	17/11/2025	- Từ dữ liệu của khách hàng và dữ liệu thu thập được từ giai đoạn khảo sát, phân tích, xây dựng cơ sở dữ liệu cho dự án - Báo cáo tiến độ	Đội 1
7	Thiết kế giao diện	18/11/2025	- Thực hiện thiết kế giao diện theo yêu cầu của khách hàng, theo đặc tả dựa trên kết quả khảo sát - Báo cáo tiến độ	Đội 2

8	Lập trình và tích hợp hệ thống	21/11/2025	- Các module chương trình đáp ứng chức năng của khách hàng - Báo cáo tiến độ	Đội 3
9	Kiểm thử và sửa lỗi	25/11/2025	- Xây dựng kế hoạch kiểm thử, kiểm thử mức đơn vị, mức tích hợp, mức hệ thống - Các kịch bản kiểm thử - Các biên bản kiểm thử - Tài liệu thực hiện sửa lỗi - Sửa lại các lỗi và hoàn thiện sản phẩm - Báo cáo tiến độ	Đội 4
10	Chuyển giao	1/12/2025	- Tài liệu hướng dẫn sử dụng sản phẩm - Báo cáo tiến độ - Phân công bảo trì và đào tạo sử dụng - Biên bản bàn giao và thanh lý hợp đồng	Người quản lý dự án

3.2.3 Diễn biến quá trình thực hiện dự án

Diễn biến quá trình dự án thực hiện dự án được mô tả thông qua các mốc dự án đã xác định.

Để theo dõi tiến trình quản lý dự án. Chúng ta rà xét các biên bản cuộc họp, thống nhất nội dung, các hoạt động được thực hiện.

3.2.3.1 Khởi động dự án

- Biên bản họp dự án

Bảng 3.2 Biên bản họp lần I

Biên bản họp thường xuyên lần I	
Tên dự án	Website bán Asset Pixel
Mã dự án	DA010
Nội dung công việc	Khởi động dự án
Chủ trì cuộc họp	Nguyễn Anh Tuấn
Thư ký	Ngô Hữu Tùng
Những người tham gia	Nguyễn Hữu Tú Lê Hải Quang Nguyễn Văn Đại
Thời gian	8-10h ngày 4/11/2025
Địa điểm	Phòng họp của công ty
Mục đích	Đưa ra được thông tin dự án, cho mọi người nắm bắt được tình hình, tư tưởng thực hiện dự án

- Tiến độ hiện tại

STT	Công việc	Thực hiện	Kết quả	Lý do hoàn thành	Hướng giải quyết
-----	-----------	-----------	---------	------------------	------------------

1	Khởi động dự án	Người quản lý dự án	Thành công		
---	-----------------	---------------------	------------	--	--

– Các tài liệu

STT	Mã số	Tài liệu
1	TLH101	Tài liệu cuộc họp theo kế hoạch lần I

– Quản lý

Quản lý cấu hình	Quản lý chất lượng	Quản lý rủi ro
	Chất lượng thực hiện công việc có hiệu quả cao	Không có rủi ro

– Kế hoạch tiếp theo

STT	Công việc	Nhóm thực hiện	Kết quả cần đạt	Thời hạn
1	Khảo sát hệ thống	Đội 1	Hiểu được hệ thống	

3.2.3.2 Khảo sát hệ thống

– Biên bản họp dự án

Bảng 3.3 Biên bản họp lần II

Biên bản họp thường xuyên lần II	
Tên dự án	Website bán Asset Pixel
Mã dự án	DA010

Nội dung công việc	Khảo sát hệ thống
Chủ trì cuộc họp	Ngô Hữu Tùng
Thư ký	Nguyễn Hữu Tú
Những người tham gia	Lê Hải Quang Nguyễn Văn Đại
Thời gian	8h-10h ngày 7/11/2025
Địa điểm	Phòng họp của công ty
Mục đích	Thu thập các thông tin thực tế để áp dụng xây dựng các chức năng cho hệ thống một cách chính xác

– Tiến độ hiện tại

STT	Công việc	Thực hiện	Kết quả	Lý do hoàn thành	Hướng giải quyết
1	Khảo sát hệ thống	Đội 1	Thành công		

– Các tài liệu

STT	Mã số	Tài liệu
1	TLH102	Tài liệu cuộc họp theo kế hoạch lần II
2	TLH103	Tài liệu khảo sát hệ thống
3	TLH104	Báo cáo 7/11/2025

– Quản lý

Quản lý cấu hình	Quản lý chất lượng	Quản lý rủi ro
Các phiên bản khảo sát đã được thư ký lưu trữ	Chất lượng thực hiện công việc có hiệu quả cao	Không có rủi ro

– Kế hoạch tiếp theo

STT	Công việc	Nhóm thực hiện	Kết quả cần đạt	Thời hạn
1	Phân tích và thiết kế chức năng	Đội 1	thiết kế được các chức năng cần có trong hệ thống	

3.2.3.3 Phân tích chức năng

– Biên bản họp dự án

Bảng 3.4 Biên bản họp lần III

Biên bản họp thường xuyên lần III	
Tên dự án	Website bán Asset Pixel
Mã dự án	DA010
Nội dung công việc	Phân tích và thiết kế chức năng
Chủ trì cuộc họp	Ngô Hữu Tùng
Thư ký	Nguyễn Hữu Tú
Những người tham gia	Lê Hải Quang Nguyễn Văn Đại
Thời gian	8h-10h ngày 11/11/2025

Địa điểm	Phòng họp của công ty
Mục đích	Tìm hiểu được hết tất cả các chức năng của hệ thống, đáp ứng được nhu cầu thực tế của khách hàng

– Tiến độ hiện tại

STT	Công việc	Thực hiện	Kết quả	Lý do hoàn thành	Hướng giải quyết
1	Phân tích và Thiết kế chức năng	Đội 1	Thành công		

– Các tài liệu

STT	Mã số	Tài liệu
1	TLH201	Tài liệu cuộc họp theo kế hoạch lần III
2	TLH202	Tài liệu phân tích chức năng của hệ thống
3	TLH203	Báo cáo 11/11/2025

– Quản lý

Quản lý cấu hình	Quản lý chất lượng	Quản lý rủi ro
Các phiên bản khảo sát đã được thư ký lưu trữ	Chất lượng thực hiện công việc có hiệu quả cao	Không có rủi ro

- Kế hoạch tiếp theo

STT	Công việc	Nhóm thực hiện	Kết quả cần đạt	Thời hạn
1	Thiết kế csdl	Đội 1	Thiết kế được các csdl cần thiết cho hệ thống	

3.2.3.4 Thiết kế cơ sở dữ liệu

- Biên bản họp dự án

Bảng 3.5 Biên bản họp lần IV

Biên bản họp thường xuyên lần IV	
Tên dự án	Website bán Asset Pixel
Mã dự án	DA010
Nội dung công việc	Thiết kế cơ sở dữ liệu
Chủ trì cuộc họp	Ngô Hữu Tùng
Thư ký	Nguyễn Hữu Tú
Những người tham gia	Lê Hải Quang Nguyễn Văn Đại
Thời gian	8h-10h ngày 14/11/2025
Địa điểm	phòng họp của công ty
Mục đích	Xây dựng cơ sở dữ liệu cho hệ thống. Đáp ứng được nhu cầu của khách hàng

– Tiến độ hiện tại

STT	Công việc	Thực hiện	Kết quả	Lý do hoàn thành	Hướng giải quyết
1	Thiết kế cơ sở dữ liệu	Đội 1	Thành công		

– Các tài liệu

STT	Mã số	Tài liệu
1	TLH204	Tài liệu cuộc họp theo kế hoạch lần IV
2	TLH205	Cơ sở dữ liệu vật lý
3	TLH206	Báo cáo ngày 14/11/2025

– Quản lý

Quản lý cấu hình	Quản lý chất lượng	Quản lý rủi ro
Các phiên bản cơ sở dữ liệu đã được nhóm trưởng lưu trữ	Chất lượng thực hiện công việc có hiệu quả cao	Không có rủi ro

– Kế hoạch tiếp theo

STT	Công việc	Nhóm thực hiện	Kết quả cần đạt	Thời hạn
1	Thiết kế giao diện	Đội 2	Giao diện phù hợp với yêu cầu của khách	

3.2.3.5 Thiết kế giao diện

– Biên bản họp dự án

Bảng 3.6 Biên bản họp lần V

Biên bản họp thường xuyên lần V	
Tên dự án	Website bán Asset Pixel
Mã dự án	DA010
Nội dung công việc	Thiết kế giao diện
Chủ trì cuộc họp	Nguyễn Anh Tuấn
Thư ký	Ngô Hữu Tùng
Những người tham gia	Nguyễn Hữu Tú Lê Hải Quang Nguyễn Văn Đại
Thời gian	8h-10h ngày 17/11/2025
Địa điểm	Phòng họp của công ty
Mục đích	Nhận xét các giao diện được thiết kế. Đưa ra các điều chỉnh, hiệu chỉnh sao cho giao diện đẹp hơn, phù hợp hơn

– Tiến độ hiện tại

STT	Công việc	Thực hiện	Kết quả	Lý do hoàn thành	Hướng giải quyết
1	Thiết kế giao	Đội 2	Thành		

	diện		công		
--	------	--	------	--	--

– Các tài liệu

STT	Mã số	Tài liệu
1	TLH301	Tài liệu cuộc họp theo kế hoạch lần V
2	TLH302	Giao diện của trang web
3	TLH303	Báo cáo 17/11/2025

– Quản lý

Quản lý cấu hình	Quản lý chất lượng	Quản lý rủi ro
Các phiên bản của giao diện trong quá trình thiết kế đều được lưu trữ lại	Đạt chất lượng HCI, và yêu cầu khách hàng	Không có rủi ro

– Kế hoạch tiếp theo

STT	Công việc	Nhóm thực hiện	Kết quả cần đạt	Thời hạn
1	Lập trình và tích hợp hệ thống	Đội 3	Code được hết chức năng của hệ thống	

3.2.3.6 Lập trình và tích hợp hệ thống

– Biên bản họp dự án

Bảng 3.7 Biên bản họp lần VI

Biên bản họp thường xuyên lần VI	
Tên dự án	Website bán Asset Pixel
Mã dự án	DA010
Nội dung công việc	Lập trình và tích hợp hệ thống
Chủ trì cuộc họp	Ngô Hữu Tùng
Thư ký	Nguyễn Hữu Tú
Những người tham gia	Nguyễn Văn Đại Lê Hải Quang
Thời gian	8h-10h ngày 21/11/2025
Địa điểm	Phòng họp của công ty
Mục đích	Code các chức năng của hệ thống

– Tiến độ hiện tại

STT	Công việc	Thực hiện	Kết quả	Lý do hoàn thành	Hướng giải quyết
1	Lập trình và tích hợp hệ thống	Đội 3	Thành công		

– Các tài liệu

STT	Mã số	Tài liệu
-----	-------	----------

1	TLH401	Tài liệu cuộc họp theo kế hoạch lần VI
2	TLH402	Các module chức năng
3	TLH403	21./11/2025

– Quản lý

Quản lý cấu hình	Quản lý chất lượng	Quản lý rủi ro
Các phiên bản module được nhóm trưởng lưu trữ	Module ổn định, thực hiện hết chức năng công việc	Không có rủi ro

– Kế hoạch tiếp theo

STT	Công việc	Nhóm thực hiện	Kết quả cần đạt	Thời hạn
1	Kiểm thử và sửa lỗi	Đội 4	Tìm và sửa các lỗi còn trong hệ thống	

3.2.3.7 Kiểm thử và sửa lỗi

– Biên bản họp dự án

Bảng 3.8 Biên bản họp lần VII

Biên bản họp thường xuyên lần VII	
Tên dự án	Website bán Asset Pixel
Mã dự án	DA010
Nội dung công việc	Kiểm thử và sửa lỗi

Chủ trì cuộc họp	Ngô Hữu Tùng
Thư ký	Nguyễn Hữu Tú
Những người tham gia	Lê Hải Quang Nguyễn Văn Đại
Thời gian	8h-10h ngày 25/11/2025
Địa điểm	Phòng họp của công ty
Mục đích	Tìm ra các thiếu sót trong hệ thống và xử lý

– Tiến độ hiện tại

STT	Công việc	Thực hiện	Kết quả	Lý do hoàn thành	Hướng giải quyết
1	Kiểm thử và sửa lỗi	Đội 4	Thành công		

– Các tài liệu

STT	Mã số	Tài liệu
1	TLH404	Tài liệu cuộc họp theo kế hoạch lần thứ VII
2	TLH405	Tài liệu kiểm thử
3	TLH406	25/11/2025

– Quản lý

Quản lý cấu hình	Quản lý chất lượng	Quản lý rủi ro
-------------------------	---------------------------	-----------------------

Các phiên bản trước khi phát hiện lỗi và sau khi sửa đã được nhóm trưởng lưu trữ	Sửa được các lỗi tìm thấy	Giảm cấu trúc dư thừa
--	---------------------------	-----------------------

- Kế hoạch tiếp theo

STT	Công việc	Nhóm thực hiện	Kết quả cần đạt	Thời hạn
1	Bàn giao	Người quản lý	Khách hàng nhận được sản phẩm ưng ý	

3.2.3.8 Bàn giao và kết thúc dự

- Biên bản họp dự án

Bảng 3.9 Biên bản họp lần VIII

Biên bản họp thường xuyên lần VIII	
Tên dự án	Website bán Asset Pixel
Mã dự án	DA010
Nội dung công việc	Bàn giao sản phẩm đạt tiêu chuẩn cho khách hàng, tổng kết và đóng dự án
Chủ trì cuộc họp	Nguyễn Anh Tuấn
Thư ký	Ngô Hữu Tùng
Những người tham gia	Nguyễn Hữu Tú Lê Hải Quang Nguyễn Văn Đại

Thời gian	8h-10h ngày 1/12/2025
Địa điểm	Phòng họp của công ty
Mục đích	Bàn giao sản phẩm cho khách, tổng kết và kt dự án

– Tiến độ hiện tại

STT	Công việc	Thực hiện	Kết quả	Lý do hoàn thành	Hướng giải quyết
1	Bàn giao	Nguyễn Anh Tuấn	Thành công		

– Các tài liệu

STT	Mã số	Tài liệu
1	TLH407	Tài liệu cuộc họp theo kế hoạch lần VIII
2	TLH408	Tài liệu ý kiến khách hàng
3	TLH409	Báo cáo 1/12/2025

– Kế hoạch tiếp theo

STT	Công việc	Nhóm thực hiện	Kết quả cần đạt	Thời hạn
1	Kết thúc dự án	Đội dự án	Dự án thành công	

Chương 4. Kết thúc dự án

4.1 Kết quả dự án

Sau quá trình lập kế hoạch, triển khai và giám sát thực hiện, dự án “Xây dựng website bán asset pixel” đã hoàn thành đúng tiến độ và đạt được các mục tiêu đề ra ban đầu. Nhóm dự án đã xây dựng thành công một website bán asset pixel hoạt động ổn định, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nghiệp vụ của khách hàng.

Cụ thể, hệ thống đã triển khai đầy đủ các chức năng chính như: quản lý tài khoản người dùng, quản lý asset pixel, danh mục sản phẩm, giỏ hàng, đặt hàng và thanh toán. Các chức năng quản trị giúp người quản lý dễ dàng thêm, sửa, xóa, cập nhật thông tin asset cũng như theo dõi hoạt động mua bán trên hệ thống.

Giao diện website được thiết kế theo phong cách hiện đại, trực quan, thân thiện với người dùng, phù hợp với đối tượng khách hàng là các nhà phát triển game và người yêu thích đồ họa pixel. Website hoạt động ổn định trên các trình duyệt phổ biến và nhiều độ phân giải màn hình khác nhau, đảm bảo trải nghiệm người dùng tốt.


Về mặt kỹ thuật, hệ thống được xây dựng với cấu trúc rõ ràng, dữ liệu được lưu trữ và quản lý tập trung, cho phép truy xuất và cập nhật nhanh chóng. Các biện pháp bảo mật cơ bản được áp dụng nhằm đảm bảo an toàn thông tin người dùng và dữ liệu giao dịch.

Ngoài ra, nhóm dự án đã hoàn thành đầy đủ tài liệu liên quan như: tài liệu phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, sơ đồ UML, cơ sở dữ liệu và hướng dẫn sử dụng. Dự án được bàn giao đầy đủ cho khách hàng theo đúng kế hoạch, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và thời gian đã cam kết.


Nhìn chung, dự án đạt kết quả tốt, đáp ứng được mục tiêu đề ra, tạo tiền đề cho việc mở rộng và phát triển thêm các tính năng trong tương lai.

Giao diện website:


- Giao diện phía người dùng:

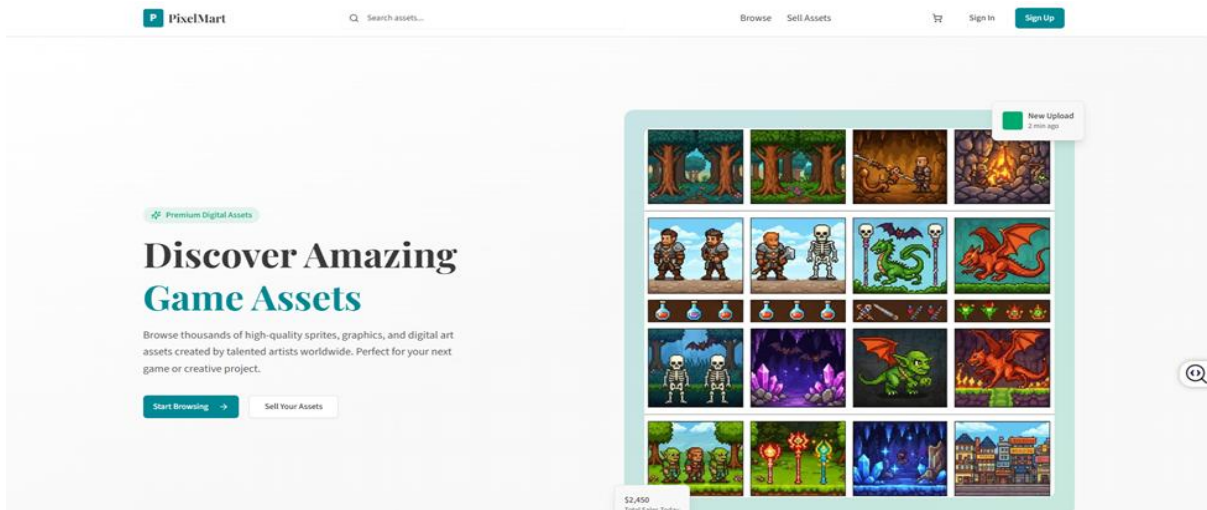


Hình 4.1 Giao diện trang chủ

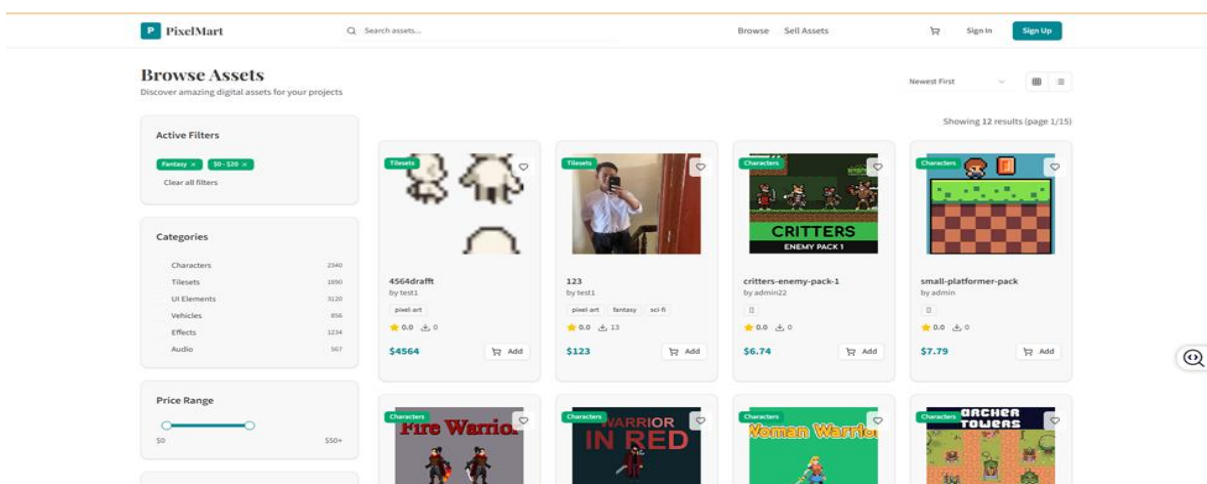


Hình 4.2 Giao diện trang danh sách sản phẩm

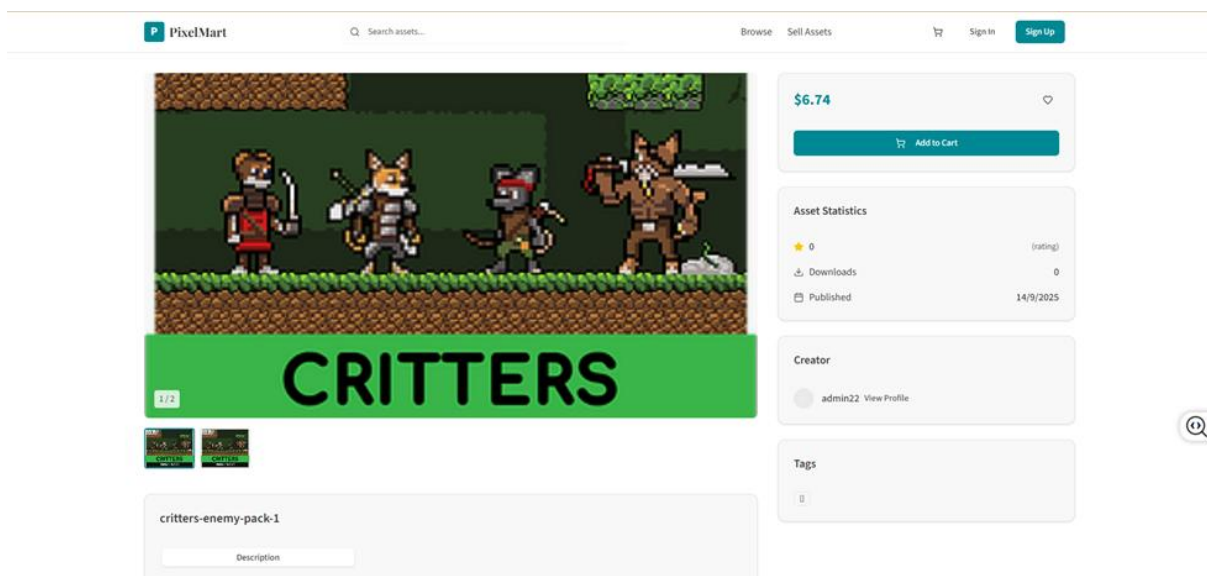

Hình 4.3 Giao diện trang chi tiết sản phẩm

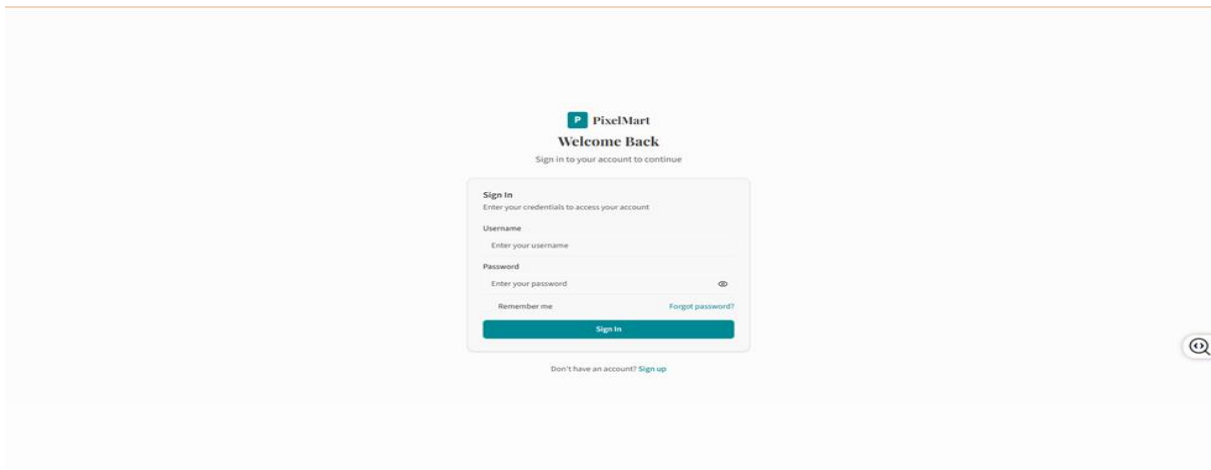


Hình 4.4 Giao diện trang đăng nhập

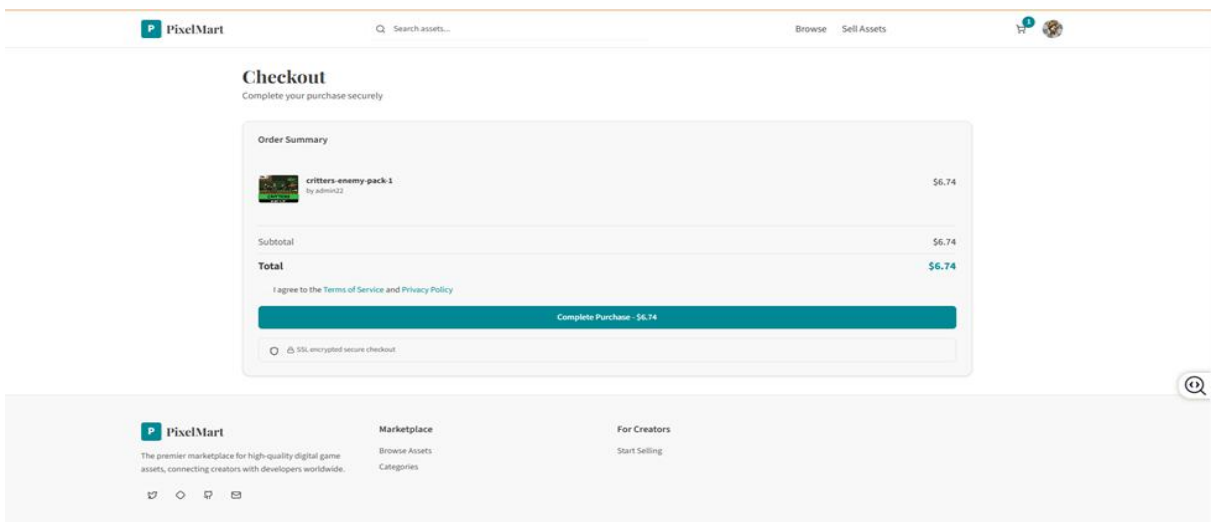


Hình 4.5 Giao diện trang đặt hàng


– Giao diện phía quản trị viên:




Hình 4.6 Giao diện trang Dashboard



Hình 4.7 Giao diện trang quản lý asset

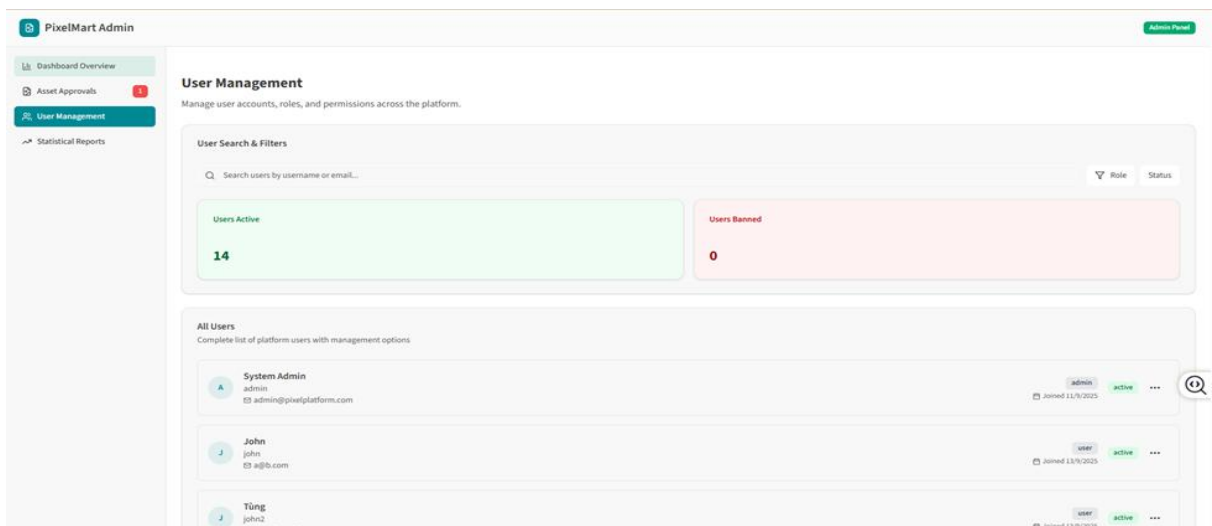

Hình 4.8 Giao diện trang quản lý tài khoản người dùng

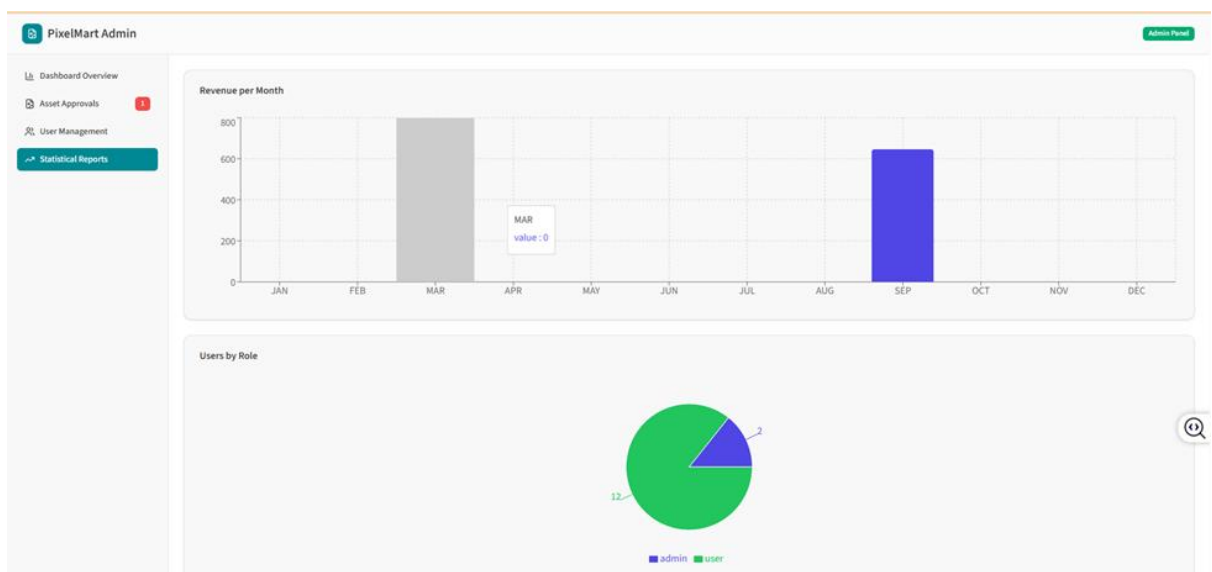

Hình 4.9 Giao diện trang báo cáo và thống kê

4.2 Đánh giá kết quả dự án

Tóm tắt dự án

- Tên dự án: Xây dựng website bán asset pixel
- Mục đích: Lập kế hoạch, triển khai và giám sát một dự án phần mềm thực tế, đồng thời tạo ra sản phẩm đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong việc quản lý và bán các gói Asset Pixel hiệu quả, tiện lợi và chuyên nghiệp
- Mục tiêu:
 - Xây dựng sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của khách hàng
 - Giao diện đẹp, thân thiện, dễ sử dụng, chạy ổn định trên tất cả các máy tính và hoàn thành sản phẩm đúng thời gian quy định.
 - Dễ dàng tùy chỉnh, truy xuất và cập nhật dữ liệu nhanh, có tính hiệu quả và bảo mật cao.
- Tổng mức đầu tư: 50.000.000 VNĐ
- Thời gian bắt đầu: 4/11/2025
- Thời gian kết thúc: 3/12/2025
- Số người tham gia: 5
- Hình thức: Thiết lập mới
- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần PixelMart
- Bài học rút ra sau khi thực hiện dự án: Thành viên trong nhóm học được cách làm việc theo nhóm, giúp đỡ lẫn nhau trong công việc và học tập, cùng nhau hoàn thành tốt các công việc được giao.
- Dự án kết thúc tốt đẹp.

4.3 Họp kết thúc dự án

- Với sự tham gia của tất cả các thành viên có liên quan tới dự án.
- Thông báo hiện trạng của dự án, dự án thành công tốt đẹp.
- Tổng kết, rút kinh nghiệm thực hiện dự án.

PHẦN III. KẾT LUẬN

1. Kết quả đạt được

Qua đề tài “Quản lý dự án xây dựng website bán Asset Pixel” các thành viên trong nhóm đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm:

- Làm việc nhóm một cách khoa học, hiệu quả.
- Biết được nhiều phương pháp trong quá trình quản lý dự án.
- Biết sử dụng phần mềm MS project.
- Tăng khả năng nắm bắt tình hình công việc.
- Tăng khả năng quản lý con người, công việc.
- Biết phân tích, nắm bắt được một công việc, hay con người.

2. Hướng phát triển đề tài

Phong cách quản lý, hướng phát triển: trong quá trình làm việc, quản lý dự án các thành viên trong nhóm tự nhận thấy được nhiều khả năng tiềm ẩn của mình. Với phong cách quản lý luôn đi trước mọi công việc, hoạch định kế hoạch một cách chính xác thì có thể nhóm quản lý sẽ không dừng lại ở mức độ là bài tập lớn mà có thể phát triển đi lên làm đồ án, hoặc có thể cao hơn nữa là quản lý những dự án trong thực tế.

Dự án: dự án được thực hiện với sự quản lý rõ ràng, chi tiết và mang tính chuyên nghiệp hơn nên đã đạt được những ưu điểm nhất định so với phong cách làm việc trước đây. Sau khi hoàn thành, dự án này cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu của một phần mềm trên thực tiễn.

Ý tưởng phát triển: hướng phát triển đó là xây dựng đồ án dựa trên bài tập lớn này với điều kiện kiến thức đạt được của từng thành viên trong nhóm là tương đối chính xác thì việc thực hiện đồ án là hoàn toàn khả thi.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Giáo trình quản lý dự án công nghệ thông tin.
- [2] Viện CNTT - ĐHQG Hà Nội, Giáo trình quản lý dự án.
- [3] Kathy Schwalbe, Information Technology Project management, Cengage Learning, 2012.
- [4] Harold Kerzner. Project management: A systems approach to planning, scheduling, and controlling, John Wiley & Sons, Inc, 2009.
